MUNICIPIO DE GUADALUPE

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

AVANCE DE OBRAS PROGRAMA P.M.O. EJERCICIO 2018

NO	NOMBRE DE LA OBRA	CALLE	COLONIA	COMUNIDAD	SUPERVISOR	ANTIDAI	UNIDAD	AVANCE FISICO	CONTRATISTA	CELULAR	CONTRATO	MONTO	SALDO POR COBRAR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	OBSERVACIONES
	RED DE DRENAJE EN CALLE RAFAEL S. MARTINEZ	RAFAEL S. MARTINEZ	OJO DE AGUA DE LA PLAMA	GUADALUPE	CELESTE			100%	RAMIRO TORRES RAMIREZ		MGU-DOPM-PMO-01-18	$ 486,838.69	0.00	22-ene-18	20-feb-18	TERMINADA
	REMODELACION CANCHA DE USOS MULTIPLES CAMPO BRAVO		CAMPO BRAVO	GUADALUPE	MARTIN			100%	COMAZA S.A. DE C.V.		MGU-DOPM-PMO-02-18	$ 153,000.00	153,000.00	29-ene-18	27-feb-18	TERMINADA, PENDIENTE DOCUMENTACION PARA TRAMITAR PAGO
	CONSTRUCCION DE PUERTAS Y REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL		LA COMARCA	GUADALUPE	MARTIN			100%	HISPANIA INVESTMENT S.A. DE C.V.		MGU-DOPM-PMO-03-18	$ 30,000.00	0.00	08-ene-18	15-ene-18	TERMINADA
	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	TULIPANES	TULIPANES	CIENEGUITAS	JOSE LUIS			100%	ING. CARLOS ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA		MGU-DOPM-PMO-04-18	$ 189,683.14	34,765.88	22-ene-18	20-feb-18	TERMINADA
	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES EN CERRO SAN SIMON			GUADALUPE	JULIO			100%	HISPANIA INVESTMENT S.A. DE C.V.		MGU-DOPM-PMO-05-18	$ 308,400.71	308,400.71	23-ene-18	22-feb-18	TERMINADA, PENDIENTE DOCUMENTACION PARA TRAMITAR PAGO
	RED AGUA POTABLE	SAN ANTONIO	SAN COSME	GUADALUPE	CELESTE			100%	JORGE HUMBERTO FUENTES SAUCEDO		MGU-DOPM-PMO-06-18	$ 70,876.05	0.00	02-ene-18	16-ene-18	TERMINADA
	RED AGUA POTABLE	GENARO CODINA		TACOALECHE	MARTIN			100%	JORGE HUMBERTO FUENTES SAUCEDO		MGU-DOPM-PMO-07-18	$ 74,983.46	0.00	17-ene-18	15-feb-18	TERMINADA
	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS EN FRACCIONAMIENTO OCTAVIO PAZ		OCTAVIO PAZ	GUADALUPE	JOSUE			100%	GRUPO CONSTRUCTOR PLATA S.A. DE C.V.		MGU-DOPM-PMO-08-18	$ 1,329,461.19	0.00	22-ene-18	22-feb-18	TERMINADA
	REHABILITACION DE PINTURA DE GUARNICIONES DE LAS AVENIDAS GARCIA SALINAS, PEDRO CORONEL, LA FE, ACCESO A BERNARDEZ Y AV. MEXICO			GUADALUPE	CELESTE			100%	ING. VICTORIANO MALDONADO IBARRA		MGU-DOPM-PMO-09-18	$ 452,935.13	0.00	31-ene-18	14-feb-18	TERMINADA
	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS EN FRACCIONAMIENTO NOVELISTAS, MANZANA 5, MANZANA 7 Y MANZANA 9		NOVELISTAS	GUADALUPE	JOSUE			100%	CONSTRUMATMAQ S.A. DE C.V.		MGU-DOPM-PMO-10-18	$ 567,755.47	0.00	15-ene-18	31-ene-18	TERMINADA
	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS EN FRACCIONAMIENTO NOVELISTAS, MANZANA 4 Y MANZANA 3		NOVELISTAS	GUADALUPE	JOSUE			100%	COMAZA S.A. DE C.V.		MGU-DOPM-PMO-11-18	$ 1,254,159.23	0.00	15-ene-18	31-ene-18	TERMINADA
	MANTENIMIENTO ALBERCA OLIMPICA DE GUADALUPE			GUADALUPE	PEDRO			50%	ING. VICTORIANO MALDONADO IBARRA		MGU-DOPM-PMO-12-18	$ 350,017.45	0.00	15-feb-18	01-mar-18	TERMINADA
	ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA			MARTINEZ DOMIN	ABELARDO			100%	GRUPO SECOMSA, CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.		MGU-DOPM-PMO-13-18	$ 209,038.50	0.00	15-ene-18	31-ene-18	TERMINADA
	ALUMBRADO PUBLICO EN CANCHA TECHADA			MARTINEZ DOMIN	ABELARDO			100%	GRUPO SECOMSA, CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.		MGU-DOPM-PMO-14-18	$ 67,426.16	0.00	01-feb-18	15-feb-18	TERMINADA
	ALUMBRADO PUBLICO EN C. RODRIGUEZ ELIAS, (JARDIN)			LA ZACATECANA	ABELARDO			100%	GRUPO SECOMSA, CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.		MGU-DOPM-PMO-15-18	$ 99,307.60	0.00	16-feb-18	28-feb-18	TERMINADA
	CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y REMODELACIONES EN EL RASTRO MUNICIPAL			GUADALUPE	AURELIO			98%	HISPANIA INVESTMENT S.A. DE C.V.		MGU-DOPM-PMO-16-18	$ 1,304,125.22	467,827.17	23-feb-18	23-abr-18	OBRA EN PROCESO
	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO E. GARCIA	FRANCISCO E. GARCIA	LA FE	GUADALUPE	PEDRO			100%	ING. LUIS ANGEL ACOSTA TORRES		MGU-DOPM-PMO-17-18	$ 85,000.00	0.00	12-feb-18	23-feb-18	TERMINADA
	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE PAMANES ESCOBEDO	PAMANES ESCOBEDO	LA FE	GUADALUPE	PEDRO			100%	ING. LUIS ANGEL ACOSTA TORRES		MGU-DOPM-PMO-18-18	$ 120,000.00	0.00	26-feb-18	09-mar-18	TERMINADA
	REMODELACION DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA, CABILDO, SECRETARIA Y FINANZAS EN EL PALACIO MUNICIPAL	AV. COLEGIO MIL	CENTRO	GUADALUPE	LILIA			100%	LIC. MARCO ANTONIO CORREA CHACON		MGU-DOPM-PMO-19-18	$ 340,000.00	0.00	01-feb-18	28-feb-18	TERMINADA
													0.00			
	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS TEMOATZIN		FRANCISCO VILLA	GUADALUPE	CELESTE			100%	JESUS MANUEL CHAVEZ RIVERA		MGU-DOPM-PMO-21-18	$ 87,734.13	0.00	09-feb-18	26-mar-18	TERMINADA

	EQUIPAMIENTO DE AREA VERDE MEDIANTE CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10,000 LTS.	SAN ANTONIO TO	FRACCTO. CAÑADA DE BERNARDEZ	GUADALUPE	LILIA			100%	ARQ. JOSE JACOBO ESPINO GARCIA		MGU-DOPM-PMO-22-18	$ 65,435.26	0.00	02-abr-18	20-abr-18	TERMINADA
	REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL		GUADALUPE MO	GUADALUPE	PEDRO			35%	TALLER HABITAT S. DE R.L. DE C.V.		MGU-DOPM-PMO-25-18	$ 435,656.51	435,656.51	15-jun-18	13-ago-18	OBRA EN PROCESO
	TERMINACION PLAZA DE LAS GARANTIAS	PLAZA GARANTIAS		GUADALUPE				100%	TALLER HABITAT			$ 160,961.40				EXCENDENTE EN PLAZA GARANTIAS
	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA	PLAZA FRAY MARGIL		GUADALUPE				100%	SECOMSA S.A. DE C.V.			$ 1,448,770.76				CABLEADO SUBTERRANEO PLAZA FRAY MARGIL
	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION SUBTERRANEA Y ALUMBRADO PUBLICO	PLAZA FRAY MARGIL		GUADALUPE				100%	SECOMSA S.A. DE C.V.			$ 1,028,363.17				CABLEADO SUBTERRANEO PLAZA FRAY MARGIL
	TERMINACION PARA BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA FRAY MARGIL	PLAZA FRAY MARGIL		GUADALUPE				100%	ING. JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO			$ 49,406.00				EXCEDENTE ACOMETIDA Y TRANSFORMADOR DE PEDESTAL
													0.00				
	PROGRAMA V DE VUELTA												0.00				
	REHABILITACION DE AREA RECREATIVA COL. EL CARMEN		EL CARMEN	GUADALUPE	CELESTE			70%	CONSTRUMATMAQ S.A. DE C.V.		MGU-DOPM-PMO-VDEV-01-1	$ 461,269.44	461,269.44	01-feb-18	02-abr-18	OBRA EN PROCESO
	CONSTRUCCION DE PISO EN CANCHA, COL. CONDE SANTIAGO DE LA LAGUNA		CONDE SANTIAG	GUADALUPE	CELESTE			90%	GRUPO FLORCORT S.A. DE C.V.		MGU-DOPM-PMO-VDEV-02-1	$ 145,421.17	145,421.17	29-ene-18	27-feb-18	OBRA EN PROCESO
	REHABILITACION DE AREA VERDE COL. LOMAS DEL VALLE		LOMAS DEL VALL	GUADALUPE	CELESTE			100%	ERIKA KARINA CARRILLO RIVAS		MGU-DOPM-PMO-VDEV-03-1	$ 112,058.61	0.00	01-feb-18	02-abr-18	TERMINADA
	REHABILITACION DE AREA VERDE COL. ORIQUIDEAS		ORQUIDEAS	GUADALUPE	CELESTE			35%	ELEAZAR QUIROZ ROLDAN		MGU-DOPM-PMO-VDEV-04-1	$ 468,206.58	144,286.08	26-ene-18	26-feb-18	OBRA EN PROCESO
	CONSTRUCCION DE MURO FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES		LOS ANGELES	GUADALUPE	PEDRO			0%	ING. LUIS ANGEL ACOSTA TORRES		MGU-DOPM-PMO-VDEV-05-1	$ 54,489.99	54,489.99	26-ene-18	26-feb-18	SE CANCELO
	REHABILITACION DE AREA VERDE COL. INDECO		INDECO	GUADALUPE	CELESTE			70%	INAR DE GUADALUPE S. DE R.L. DE C.V.		MGU-DOPM-PMO-VDEV-06-1	$ 681,771.00	477,239.70	12-feb-18	30-abr-18	OBRA EN PROCESO
	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES PRIMERA ETAPA EN COL. EL PARAISO		EL PARAISO	GUADALUPE	CELESTE			100%	SULEYMA YANELY RODRIGUEZ GARCIA		MGU-DOPM-PMO-VDEV-07-1	$ 226,072.78	0.00	08-feb-18	09-mar-18	TERMINADA
													0.00				

MUNICIPIO DE GUADALUPE

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

AVANCE DE OBRAS PROGRAMAFIII EJERCICIO 2018

NO	NOMBRE DE LA OBRA	CALLE	COLONIA	COMUNIDAD	SUPERVISOR	ANTIDA	UNIDAD	AVANCE FISICO	CONTRATISTA	CONTRATO	MONTO	SALDO POR COBRAR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	ADJUDIC	CONTRA	FACTUR	INICIO	RESIDEN	SUPERVI	PERMIS
	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN PRIMARIA JUAN PABLO GARCIA MALDONADO EN AV. BARONES	AV. BARONES		GUADALUPE	LILIA	91.44	M.L.	100%	ING. SALVADOR GARCIA HERRERA	MGU-DOPM-FIII-CS-01-18	$ 124,621.26	0.01	15-mar-18	12-jun-18	X	X	X	X	X	X	X
	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN PRIMARIA RAFAEL CORONEL, COL. LAS QUINTAS		LAS QUINTAS	GUADALUPE	IZCOATL	149.90	M.L.	98%	INAR DE GUADALUPE S. DE R.L. DE C.V.	MGU-DOPM-FIII-CS-02-18	$ 214,901.47	149,935.30	20-abr-18	18-jul-18	X	X	NA	X	X	X	X
	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN COL. FRANCISCO VILLA		FRANCISCO VILLA	GUADALUPE	PEDRO	104.00	M.L.	100%	ARQ. PEDRO ALVARO ROSALES	MGU-DOPM-FIII-CS-03-18	$ 104,967.01	0.00	04-abr-18	01-ago-18	X	X	X	X	X	X	X
	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS EN COL. AFRICA		AFRICA	GUADALUPE	PEDRO	202.00	M.L.	0%	CONSTRUCCIONES Y PRODUCTOS DEL NORTE CALI S. DE R.L. DE C.V.	MGU-DOPM-FIII-CS-04-18	$ 337,272.97	236,091.08	13-abr-18	11-jul-18	X	X	X	X	X	X	X
	MANO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN EL BORDO		EL BORDO	PEDRO			100%	TAIC TALLER DE ARQUITECTURA, INGENIERO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	MGU-DOPM-FIII-CS-05-18	$ 252,431.15	0.01	03-abr-18	01-jul-18	X	X	X	X	X	X	X
	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA 12.00X8.00 MTS. EDIF. "D" JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA, SANTA MONICA		SANTA MONICA	PEDRO	96.00	M2	100%	ING. VICTORIANO MALDONADO IBARRA	MGU-DOPM-FIII-CS-06-18	$ 228,599.86	92,252.44	22-mar-18	19-jun-18	X	X	NA	X	X	X	X
	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA 6.00X8.00 MTS. EDIF. "D" PRIMARIA LAZARO CARDENAS, COL. BELLAVISTA		BELLAVISTA	GUADALUPE	MARTIN	48.00	M2	0%	ARQ. JUANA MONSERRAT MARTINEZ CHAVEZ	MGU-DOPM-FIII-CS-07-18	$ 120,863.55	120,863.55	03-abr-18	01-jul-18	X	X	NA	X	X		X
	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN SECUNDARIA PEDRO VELEZ COL. EL CARMEN		EL CARMEN	GUADALUPE	MARTIN	159.27	M.L.	0%	ING. LUIS ANGEL ACOSTA TORRES	MGU-DOPM-FIII-CS-08-18	$ 255,636.54	255,636.54	21-mar-18	18-jun-18	X	X	NA	X	X		X
	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA 6.00X8.00 MTS. EDIF. "D" ESCUELA PRIMARIA GENARO CODINA, VIBORITAS			VIBORITAS	MARTIN	48.00	M2	60%	DESARROLLADORA TOPACIO S.A. DE C.V.	MGU-DOPM-FIII-CS-09-18	$ 121,382.19	121,382.19									X
	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA 6.00X8.00 MTS. EDIF. "D" PREPARATORIA DANIEL CAMARENA, SAN JERONIMO			SAN JERONIMO		48.00	M2	0%	SVC	MGU-DOPM-FIII-CS-10-18	$ 120,863.55	120,863.55									X
	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA 6.00X8.00 MTS. EDIF. "D" JARDIN DE NIÑOS MARIE CURIE, COL. EJIDAL		EJIDAL	GUADALUPE	PEDRO	48.00	M2	40%	ING. JORGE ARTURO SANCHEZ ESCOBEDO	MGU-DOPM-FIII-CS-11-18	$ 120,863.55	84,604.49	13-abr-18	11-jul-18	X	X	X	X	X	X	X
	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA 6.00X8.00 MTS. EDIF. "D" ESCUELA CONAFE RAMON LOPEZ VELARDE, LAGUNA HONDA			LAGUNA HONDA	IZCOATL	48.00	M2	98%	JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ	MGU-DOPM-FIII-CS-12-18	$ 120,863.55	9,363.17	23-mar-18	20-jun-18	X	X	NA	X	X	X	X
	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN PRIMARIA PEDRO CORONEL, COL. ARBOLEDAS		ARBOLEDAS	GUADALUPE		58.92	M.L.	0%	ING. LUIS ANGEL ACOSTA TORRES	MGU-DOPM-FIII-CS-13-18	$ 111,975.60	111,975.60	16-abr-18	04-jun-18	X	X	NA	X	X		X
	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN PRIMARIA EULALIA GUZMAN BARRON, COL. EL CARMEN		EL CARMEN	GUADALUPE		48.00	M.L.	0%	ING. LUIS ANGEL ACOSTA TORRES	MGU-DOPM-FIII-CS-14-18	$ 67,400.35	67,400.35									X
											$ 1,014,012.56	1,014,012.56									
											$ 1,288,630.04	1,288,630.04									
												0.00									
												0.00									
												0.00									
												0.00									
												0.00									
												0.00									
												0.00									
												0.00									
												0.00									
												0.00									
												0.00									
												0.00									
												0.00									
												0.00									
												0.00									
												0.00									
												0.00									
												0.00									
												0.00									
												0.00									
												0.00									


ANTICIP	CUMPLI	CATALOG	PROGRA	VICIOS	TERMINO	FINIQUITO	ACTA E-R	OBSERVACIONES
X	X	X	X	X	X	X		TERMINADA
NA	X	X	X					OBRA EN PROCESO
X	X	X	X	X	X	X		TERMINADA
X	X	X	X					NO HAY MATERIALES POR PARTE DE LA SEC
X	X	X	X	X	X	X		TERMINADA
NA	X	X	X					OBRA EN PROCESO
NA	X	X	X					NO HAY MATERIALES POR PARTE DE LA SEC
NA	X	X	X					NO HAY MATERIALES POR PARTE DE LA SEC
	X	X	X					OBRA EN PROCESO
	X	X	X					NO HAY MATERIALES POR PARTE DE LA SEC
X	X	X	X					OBRA EN PROCESO
NA	X	X	X					OBRA EN PROCESO
NA	X	X	X					NO HAY MATERIALES POR PARTE DE LA SEC
								NO HAY MATERIALES POR PARTE DE LA SEC

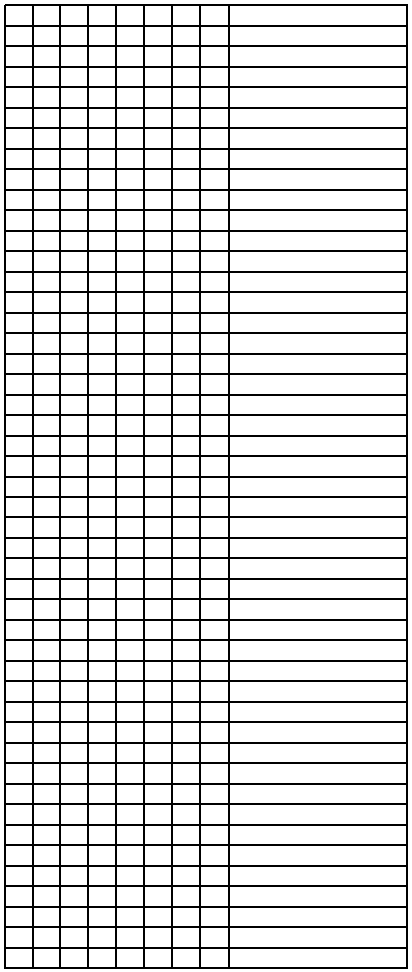

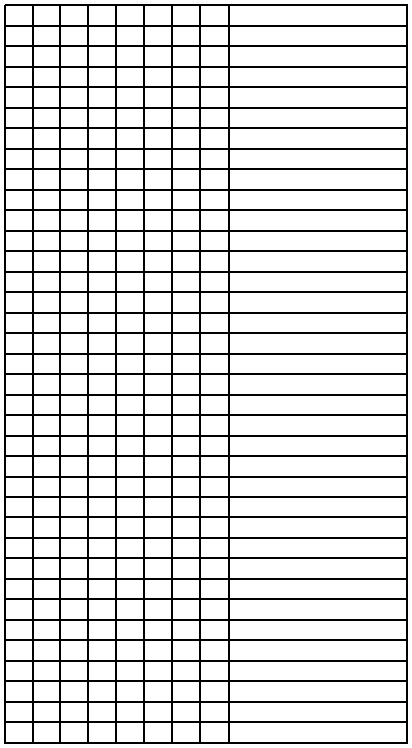

ANTICIPO			ESTIMACION 1			ESTIMACION 2			ESTIMACION 3			ESTIMACION 4			ESTIMACION 5			ESTIMACION 6			EST
MONTO	FECHA	FACTURA	MONTO	FECHA	FACTURA	MONTO	FECHA	FACTURA	MONTO	FECHA	FACTURA	MONTO	FECHA	FACTURA	MONTO	FECHA	FACTURA	MONTO	FECHA	FACTURA	MONTO
$ 37,386.38	16-mar-18	A 112	$ 26,848.47	25-abr-18	A 113	$ 38,837.71	15-may-18	A 114	$ 21,548.69	12-jun-18	A 115										
			$ 64,966.17	31-may-18	6																
$ 31,490.10	24-abr-18	E6EF	$ 73,476.91	28-may-18	8A75																
$ 101,181.89	24-abr-18	EA38																			
$ 75,729.34	24-abr-18	F095B	$ 176,701.80	01-jun-18	5																
			$ 136,347.42	11-may-18	B-507																
$ 36,259.06	22-may-18	1132																			
			$ 57,056.24	03-may-18	1218	$ 54,444.14	12-jun-18	1228													

TIMACION 7		ESTIMACION 8			ESTIMACION 9		
FECHA	FACTURA	MONTO	FECHA	FACTURA	MONTO	FECHA	FACTURA

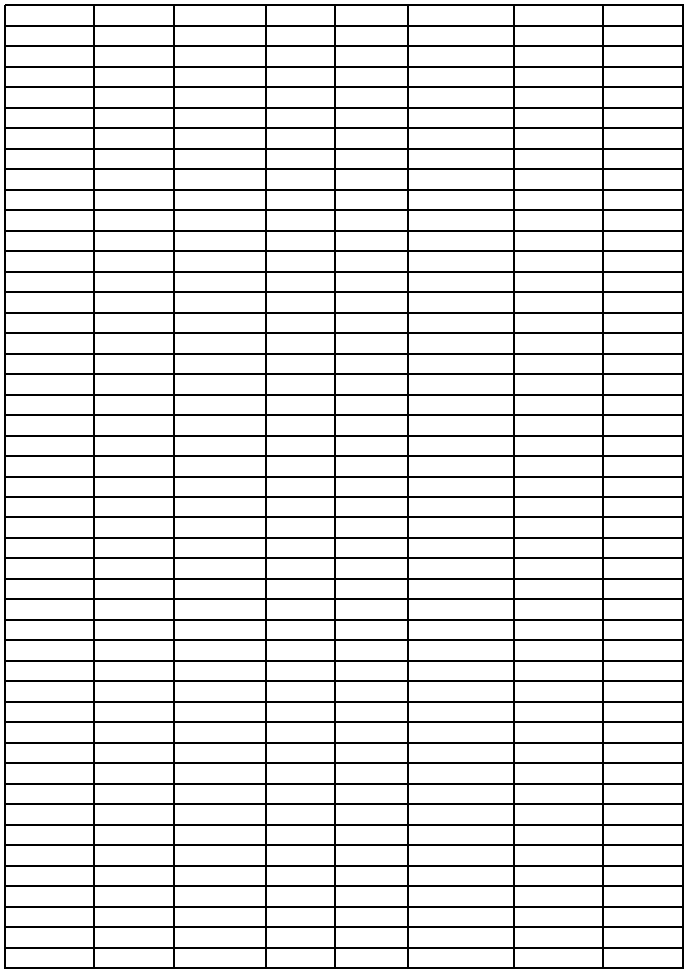

NO	NOMBRE DE LA OBRA	CALLE	COLONIA	COMUNIDAD	SUPERVISOR	ANTIDAD	UNIDAD	AVANCE FISICO
	RELOCALIZACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMINETO DE AGUA POTABLE A 300 MTS. DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA, MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.			SANTA MONICA	JOSE LUIS			35%

MUNICIPIO DE GUADALUPE

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

AVANCE DE OBRAS PROGRAMA FIII CONAGUA EJERCICIO 2018

CONTRATISTA	CELULAR	CONTRATO	MONTO	SALDO POR COBRAR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	ADJUDIC	CONTRA	FACTUR	INICIO	RESIDEN
ING. JORGE OCTAVIO NAVA RUELAS		MGU-DOPM-FIII-CONAGUA-01-1	$ 1,497,622.99	748,811.50	30-may-18	26-sep-18		X	X	X	X

SUPERVI	PERMIS	ANTICIP	CUMPLI	CATALOG	PROGRA	VICIOS	TERMINO	FINIQUITO	ACTA E-R	OBSERVACIONES
X	X	X	X	X	X					OBRA EN PROCESO

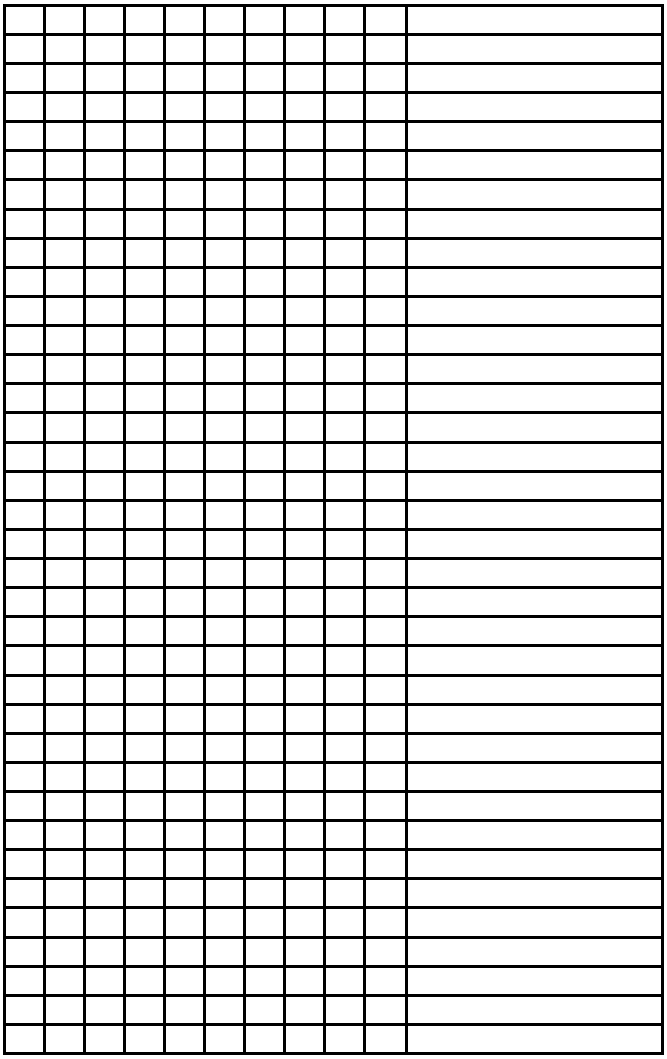

ANTICIPO			ESTIMACION 1			ESTIMACION 2			ESTIMACION	
MONTO	FECHA	FACTURA	MONTO	FECHA	FACTURA	MONTO	FECHA	FACTURA	MONTO	FECHA
$ 748,811.49	01-jun-18	419								

3	ESTIMACION 4			ESTIMACION 5			ESTIMACION 6			EST
FACTURA	MONTO	FECHA	FACTURA	MONTO	FECHA	FACTURA	MONTO	FECHA	FACTURA	MONTO

TIMACION 7		ESTIMACION 8			ESTIMACION 9		
FECHA	FACTURA	MONTO	FECHA	FACTURA	MONTO	FECHA	FACTURA

NO	NOMBRE DE LA OBRA	CALLE	COLONIA	COMUNIDAD	SUPERVISOR	ANTIDAI	UNID AD	AVANCE FISICO
	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN EL JARDIN DE COLONIA INDECO		INDECO	GUADALUPE				80%

MUNICIPIO DE GUADALUPE

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

AVANCE DE OBRAS PROGRAMA INCLUSION EJERCICIO 2018

CONTRATISTA	CELULAR	CONTRATO	MONTO	SALDO POR COBRAR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	ADJUDIC	CONTRA	FACTUR	INICIO	RESIDEN
SVC S.A DE C.V.		MGU-DOPM-INCLUSION-01-18	$ 40,000.00	40,000.00	18-ene-18	16-mar-18			NA		

SUPERVI	PERMIS	ANTICIP	CUMPLI	CATALOG	PROGRA	VICIOS	TERMINO	FINIQUITO	ACTA E-R	OBSERVACIONES
		NA	CC	X	X	CC				SIN INICIAR

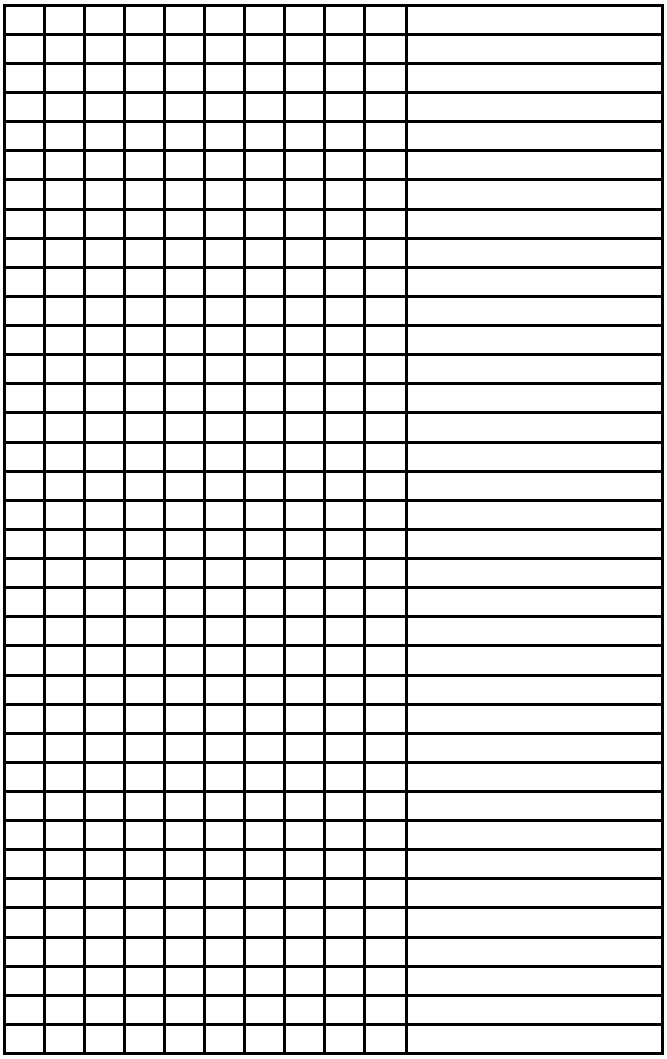

ANTICIPO			ESTIMACION 1			ESTIMACION 2			ESTIMACION	
MONTO	FECHA	FACTURA	MONTO	FECHA	FACTURA	MONTO	FECHA	FACTURA	MONTO	FECHA

3	ESTIMACION 4			ESTIMACION 5			ESTIMACION 6			EST
FACTURA	MONTO	FECHA	FACTURA	MONTO	FECHA	FACTURA	MONTO	FECHA	FACTURA	MONTO

TIMACION 7		ESTIMACION 8			ESTIMACION 9		
FECHA	FACTURA	MONTO	FECHA	FACTURA	MONTO	FECHA	FACTURA
